


Carretera Mex 185 Coatzacoalcos – Villahermosa

Tabasco

Descripción:
El proyecto consiste en la ampliación de 4 a 8 carriles de circulación de la carretera Coatzacoalcos – Villahermosa, tramo: Entronque Reforma – Villahermosa, del km 148+840 al km 157+500 (8.66 km), y del km 160+700 al km 165+740 (5.04), en una longitud total 13.7 kilómetros.

- Beneficios:**
- Ahorro en tiempo: 20 minutos
 - TDPA: 43,648
 - Población beneficiada: 1,086,954 habitantes de los municipios Centro y Cárdenas.

- Empleos Generados:**
- Directos: 3,520
 - Indirectos: 10,560

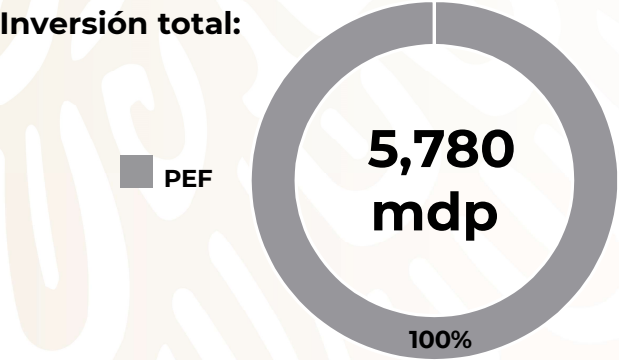

Inicio de Obra
AGO-2014
Inicio de Operación
Posterior al 2024

Preinversión (tramos o trabajos con factibilidades abiertas)	Ejecución
3.2 km de troncal. PSV 154+960, Entronques Reforma, Puente Los Monos IV, PIP´s y Distribuidor Vial Los Monos	KM 149+980 al km 154+300

- Decisiones clave**
- Dar continuidad al proceso de licitación del tramo faltantes, así como de las estructuras.


Meta

Inversión (mdp)
Tiempo (meses)

Alcance	Qué se ha hecho	Cuánto falta por hacer
<ul style="list-style-type: none">13.7 KM5 Pasos Superiores Vehiculares2 entronques1 Puente19 Puentes Peatonales	<ul style="list-style-type: none">5.4 km4 PSV8 Puentes Peatonales	<ul style="list-style-type: none">3.2 km1 PSV1 Puente8 Puentes Peatonales
5,780	2,800.7	2,979.3
13 años	9 Años	4 Años

Factibilidades

	Tipo	Dependencia/ Área que expide/autoriza	Autoriza do	Fecha de obtención	Aspectos Relevantes
Técnica	Proyecto Ejecutivo	DGC-DEP	Si	30-ago-2023	Por regularizar el tramo donde se construye el Muro de CONAGUA.
Económica	Registro en cartera	SHCP	Si	-----	Registro vigente No. 13096470001, se solicitio la recalendarización a la DGC y SHCP
Legal	Derecho de Vía	CENTRO SICT	Si	-----	Se cuenta con el 98% del Derecho de Vía, teniendose invasiones en 5 puntos, los cuales están siendo atendidos por este Centro SCT.
	CFE	CFE	Si	Por evento	Desde el inicio de la obra en el año 2014, se realizó el cambio de las líneas de alta tensión.
	CONAGUA	CONAGUA	Si	Por evento	CONAGUA autorizo el tramo del 148+9800 al km 151+980 del contrato actual 2023
	PEMEX	PEMEX	No aplica	No Aplica	
Ambiental	Manifestación de Impacto Ambiental	SEMARNAT	En proceso de ampliación	29-07-2009	Actualmente se encuentra en proceso el informa para ampliar el plazo hasta el 2026
	Estudio Técnico Ejecutivo	SEMARNAT	No	No aplica	
	Cambio de uso de suelo	SEMARNAT	No	No aplica	

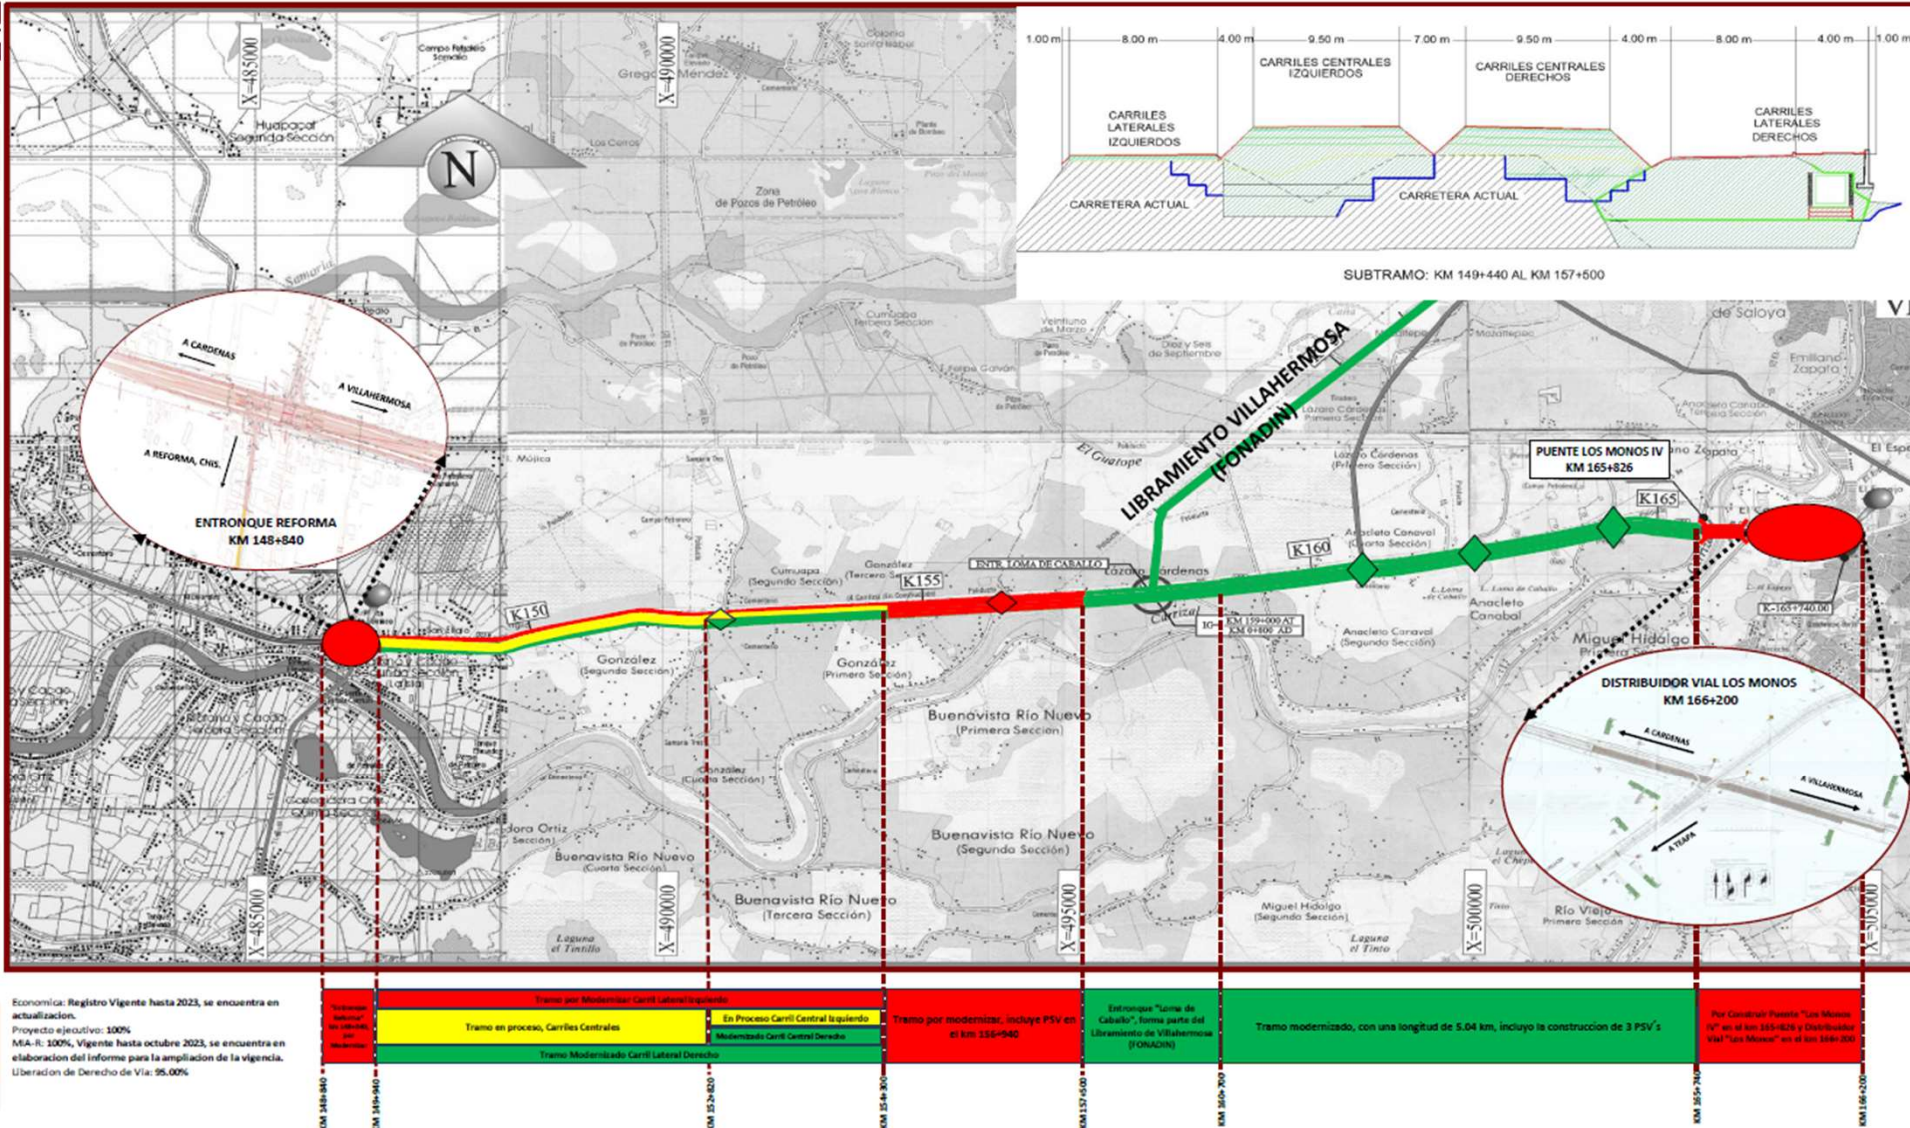

Económica: Registro Vigente hasta 2023, se encuentra en actualización.
Proyecto ejecutivo: 100%
M&E: 100%, Vigente hasta octubre 2023, se encuentra en elaboración del informe para la ampliación de la vigencia.
Liberación de Derecho de Vía: 95.00%
